
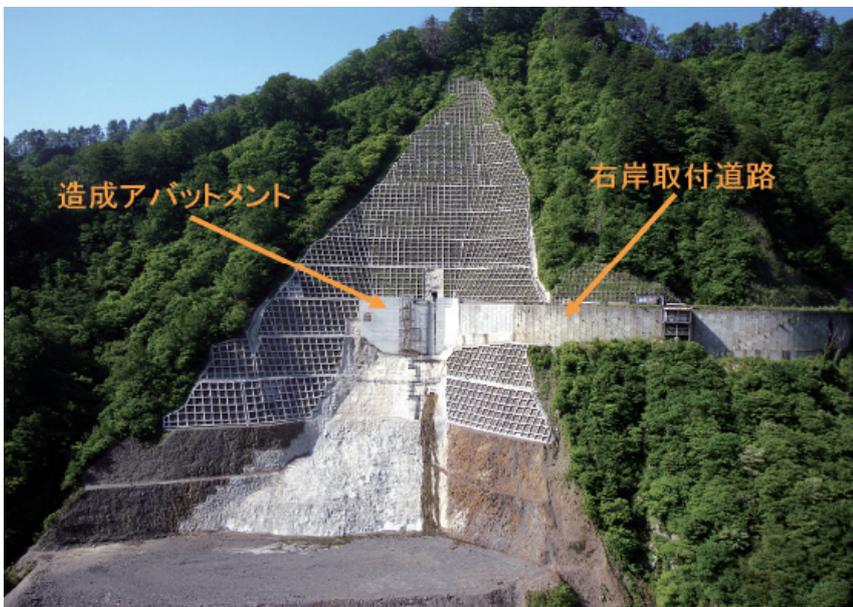


奥胎内ダム

| | |
|-----------|---------------------------|
| 型 式 | ：重力式コンクリートダム |
| 堤 高 | ：82.0m |
| 堤 頂 長 | ：198.9m |
| 堤 体 積 | ：260,000m ³ |
| 総 貯 水 量 | ：10,000,000m ³ |
| 有 効 貯 水 量 | ：7,700,000m ³ |

堤体上流側よりダムサイトを望む
(平成21年5月27日 撮影)

- ・平成15～平成16年度仮排水トンネル施工
- ・平成17年度より基礎掘削工に着手
- ・平成20年度末現在 全掘削量290,400m³の76%にあたる219,300m³まで掘削完了

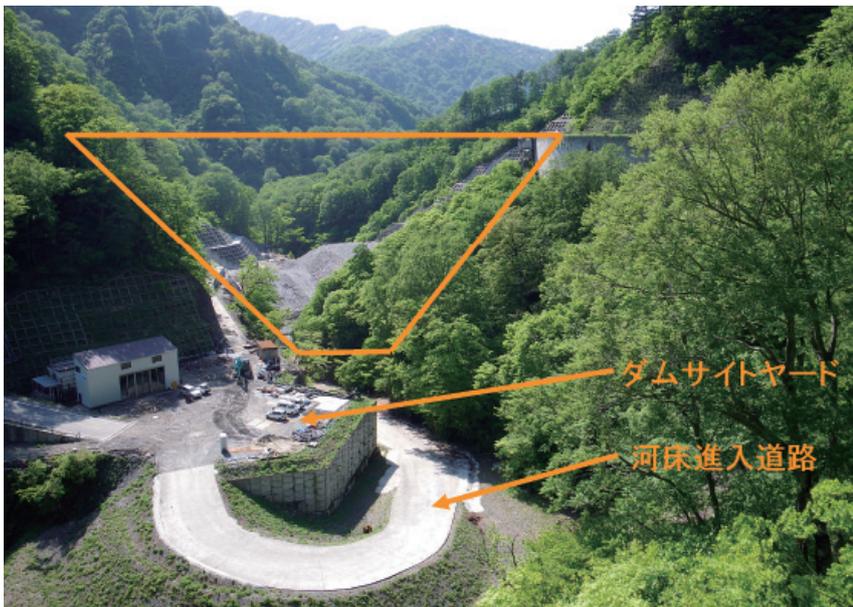

右岸側基礎掘削状況

(E L 517～E L 365完了)

- ・平成19～20年度に右岸造成アバットメントを施工



左岸側基礎掘削状況

(EL464～EL355完了)
